



#### 2 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Construção de escola Projeto FNDE 2 - Salas, na comunidade do Tomé Nunes

CONCEDENTE				
FNDE				
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
	TC 016-901		30/06/2017	232.269,38

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
03/11/2014	3.434	BANCO DO BRAISL	12.083-9	46.453,88	185.815,50

property and the contract of t				
COMPANHIA BRASILEIRA D	E SERVIÇOS INDUSTRIA	AIS E INFRAEST	RUTURA	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF
PROC. LICITATÓRIO №	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 004-2014	2014-179-000			231.776,83

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	MEDIÇÃO	100	PAGTO	SALDO
02/01/2015	77	15/04/15	23/04/2015	01 MED	19%	44.434,27	187.342,56
						-	-

EMPRESA CONTRATADA		an Walling		
LUMA PROJETOS E CONS	TRUÇÕES LTDA - EPP			
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 09-2016	2016-075-000	23/11/16	21/05/17	167.540,62

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	MEDIÇÃO	PAGTO	SALDO

OBSERVAÇÃO:

Obra paralisada





#### 2 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Construção de quadra escolar coberta - Distrito de Canabrava

CONCEDENTE				The state of the state of
FNDE	The Comment of the Co	Assert Const. ) and things to provide the current		minute () (estados per of timo bro lea terra (o manda)
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
	PAC 208.590-2014		The state of the s	509.242,08

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
07/05/2014	641.804	BANCO DO BRAISL	12.175-4	101.848,42	407.393,66
19/08/2014	644.562	BANCO DO BRAISL	12.175-4	101.997,04	305.396,62
10/08/2015	807.751	BANCO DO BRAISL	12.175-4	35.646,95	269.749,67
18/08/2015	808.041	BANCO DO BRAISL	12.175-4	76.386,31	193.363,36
29/06/2016	816.981	BANCO DO BRAISL	12.175-4	101.848,42	91.514,94

EMPRESA CONTRATADA	Ei Silber							
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS E INFRAESTRUTURA								
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO №	INÍCIO	TERMINO	VALOR				
TP 003-2014	2014-178-000	24/09/14	24/02/15	508.880,68				
RESCISÃO								

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	MEDIÇÃO	41%	PAGTO	SALDO
02/01/2015	157	28/01/15	29/01/2015	01ª MED	8%	39.419,61	469.461,07
02/01/2015	402	05/03/15	05/03/2015	02ª MED	15%	75.208,43	394.252,64
02/01/2015	542	25/03/15	31/03/2015	03ª MED	19%	95.699,33	298.553,31

STRUÇÕES LTDA - EPP	data title	and the second of the second o	
CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
2016-149-000	23/11/16	21/05/17	285.982,43
2016-149-003		23/11/18	
	2016-149-000	CONTRATO N° INÍCIO 2016-149-000 23/11/16	CONTRATO №         INÍCIO         TERMINO           2016-149-000         23/11/16         21/05/17






-	0	TD	OI F		CVE	CIL	-ÃO
C	UN	IIR	ULE	: DA	EXE	CU	VAU

DATA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	MEDIÇÃO	32%	PAGTO	SALDO
adding Phoparing york ( + a - F	Total Control of the	30/12/16	P 19677 1 111131 4 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01ª MED	9%	25.722,20	260.260,23
		30/12/16		01ª MED	23%	66.298,00	219.684,43

Esta obra resulta-se do Projeto do FNDE denominado **QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO** destina-se a atender à demanda de espaço para práticas esportivas nas escolas municipais e estaduais, apresentando área total de 980,40 m² de cobertura, para implantação em terrenos de 30x41 metro.

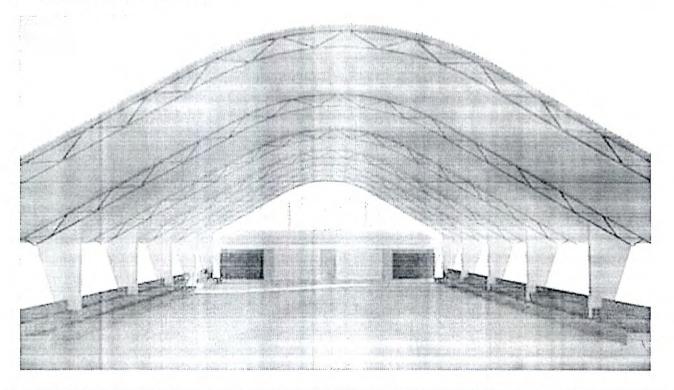

#### OBSERVAÇÃO:

Dos trabalhos de análise e acompanhamento da execução deste com convênio, esta Controladoria faz as seguintes observações:

a) O contrato originalmente firmado com a COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS E INFRAESTRUTURA, instrumento contratual nº 178/2014 foi rescindido unilateralmente, em face do envolvimento da contratada com a Operação Burla realizada pela Polícia Federal. O termo de rescisão está publicado no Diário Oficial do Município de sua edição nº 1.090 de 04/08/2016.





- b) Da análise dos documentos contábeis verificou a existência de pagamento no valor de R\$ 210.327,37, correspondendo a execução de 41% da obra, conforme processo de pagamento nº 157 / 402 e 542 realizados no exercício de 2015.
- c) Para dar continuidade a execução da obra, foi contratada a empresa LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do processo licitatório nº TP 008-2016, Homologado em 23/11/2016, cuja publicação consta no Diário Oficial do Município em sua edição nº 1.109 de 25/11/2016.
- d) Observa-se ainda que no mesmo dia da homologação, ou seja, 23/11/2016, foi firmado o instrumento contratual, que recebeu a numeração 149-2016, também publicado no Diário Oficial do Município, na mesma edição citada no parágrafo anterior.
- e) Ressalta-se que no mesmo dia da homologação e assinatura do contrato, foi também dada a ordem de serviços para o inicio dos trabalhos. Visita realizada por esta controladoria ao local da obra constatou-se que a obra encontra-se em ritmo lento.

### RECOMENDAÇÃO:

Que a empresa contratada seja notificada a apresentar suas explicações que justifique o atraso na execução obra, que seja também solicitado do FNDE informações quanto a existência de programação para a liberação do saldo restantes dos recursos.





### 4 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Alice Maria - na sede do município.

CONCEDENTE	A Surger College	1		
FNDE				
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
PAC II	208.590-2014	2011	***************************************	509.242,08

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
17/10/2016	832.162	BCO DO BRASIL	13.443-0	66.298,08	442.944,00
27/12/2016	845.541	BCO DO BRASIL	13.443-0	214.193,79	228.750,21

EMPRESA CONTRATADA  LUMA PROJETOS E CONS	STRUÇÕES I TDA - EPP			
PROC, LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 03-2016	2016-062-000	03/02/16	31/12/16	508.973,40
ADITIVO DE VALOR	2016-062-001	01/01/17	30/04/17	

#### CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	P.PGTO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	MEDIÇÃO	100%	PAGTO	SALDO
03/02/2016	0460-2016	25/02/16	25/02/2016	01ª MED	5%	26.727,16	482.246,24
03/02/2016	1171-2016	19/05/16	02/06/2016	02ª MED	14%	73.145,33	409.100,91
03/02/2016	2115-2016	06/10/16	03/11/2016	03ª MED	15%	75.913,00	333.187,91
03/02/2016	0345-2017	29/12/16	22/03/2017	04ª MED	42%	214.193,39	118.994,52
01/12/2017	2655-2017	04/12/17	29/12/2017	05ª MED	13%	66.298,08	52.696,44
01/01/2018	0605-2018	07/03/18	23/03/2018	06ª MED	10%	52.696,44	-

OBSERVAÇÃO:

Obra concluída





5	OBRA /	<b>SERVIÇOS</b>	DE	<b>ENGENHARIA</b>
---	--------	-----------------	----	-------------------

Construção de escola Projeto FNDE 2 - Salas, no Assentamento Bela Vista

CONCEDENTE		Jane China Compa		
FNDE	and and any and the second control of the se			The state of the s
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	início	TERMINO	VALOR
partine at a security and a factor of the security and a security of the security at a	PAR 031.652	in der versche eit der state eine Australia (Leuten aus	30/06/2017	244.062,22

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
08/07/2014	2.031	BANCO DO BRAISL	12.469-9	97.624,88	146.437,34

EMPRESA CONTRATADA				
COMPANHIA BRASILEIR	A DE SERVIÇOS INDUSTRI	IAIS E INFRAE	STRUTURA	
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO N°	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 002-2015			The state of the s	239.280,30
				,

## CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	EMPENHO	P. PAGTO	PAGTO	MEDIÇÃO	43%	PAGTO	SALDO
04/05/2015	0935-2015	annananananan asar an maran merekeran ba	13/05/2015	01ª MED	28%	68.193,66	171.086,64
04/05/2015	1113-2015		03/06/2015	02ª MED	10%	24.983,83	146.102,81
04/05/2015	1539-2015		22/07/2015	03ª MED	4%	9.988,81	136.114,00

EMPRESA CONTRATADA				
LUMA PROJETOS E C	ONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO N°	INÍCIO	TERMINO	VALOR

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	MEDIÇÃO	market in the	PAGTO	SALDO
			to the bound	March Control of Contr		THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN POST OF THE PERSON NAMED IN PROPERTY OF THE PERSON NAM	The state of the s
	-						





#### OBSERVAÇÃO:

Dos trabalhos de análise e acompanhamento da execução deste com convênio, esta Controladoria faz as seguintes observações:

- a) O contrato originalmente firmado com a COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS E INFRAESTRUTURA, instrumento contratual nº 179/2014 foi rescindido unilateralmente, em face do envolvimento da contratada com a Operação Burla realizada pela Polícia Federal. O termo de rescisão está publicado no Diário Oficial do Município de sua edição nº 1.090 de 04/08/2016.
- b) Da análise dos documentos contábeis verificou a existência de pagamento no valor de R\$ 44.434,27 referente à 1ª medição, correspondendo a execução de 19% da obra, conforme processo de pagamento nº 736 de 23/04/2015.
- c) Para dar continuidade a execução da obra, foi contratada a empresa LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do processo licitatório nº TP 009-2016, Homologado em 23/11/2016, cuja publicação consta no Diário Oficial do Município em sua edição nº 1.109 de 25/11/2016.
- d) Observa-se ainda que no mesmo dia da homologação, ou seja, 23/11/2016, foi firmado o instrumento contratual, que recebeu a numeração 075-2016, também publicado no Diário Oficial do Município, na mesma edição citada no parágrafo anterior.
- e) Ressalta-se que no mesmo dia da homologação e assinatura do contrato, foi também dada a ordem de serviços para o inicio dos trabalhos. Visita realizada por esta controladoria ao local da obra constatou-se que a obra encontra-se abandonada

## RECOMENDAÇÃO:


Que <u>a empresa contratada seja notificada a apresentar suas explicações que justifique o abandono da obra, que seja também solicitado do FNDE informações quanto a existência de programação para a liberação do saldo restantes dos recursos.</u>

Esta obra resulta-se do Projeto do FNDE denominado **Espaço Educativo Rural de 2 Salas de Aula** destina-se à construção de escola de um pavimento, a ser implantada em assentamentos ou pequenas comunidades rurais nas diversas regiões do Brasil.





O edifício tem capacidade de atendimento de até 120 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 60 alunos em período integral. Foi considerada como ideal a implantação dessas escolas em terreno retangular com medidas de 35m de largura por 25m de profundidade e declividade máxima de 3%. Abaixo, foto ilustrativa disponibilizada na página do FNDE.

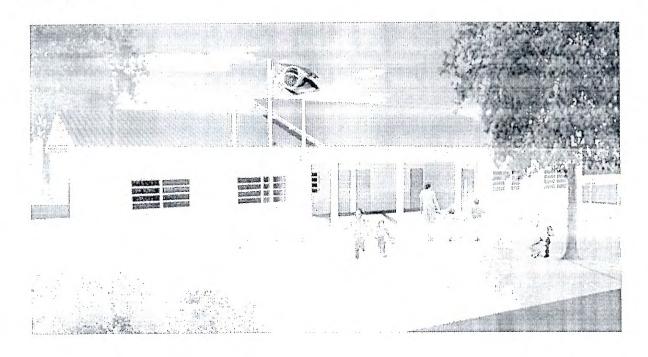





#### 6 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Construção de quadra poliesportiva no povoado de Serra de Justino - Zona rural do município de Malhada.

CONCEDENTE							
MINISTÉRIO DO ESPORTE							
PROGRAMA	CONVÉNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR			
MIN. DO ESPORTE	802.587-2014			250.000,00			

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
17/10/2017	000.000	BCO DO BRASIL		125.000,00	125.000,00

EMPRESA CONTRATADA							
LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP							
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR			
TP 04-2016	2016-063-000	03/02/16	31/12/16	253.806,79			
TERMO ADITIVO	2016-063-001	01/01/17	30/04/17				
TERMO ADITIVO	2016-063-002	01/05/17					
TERMO ADITIVO			All and the				
TERMO ADITIVO			4				

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

DATA	LIQUIDA	P. PAGTO	PAGTO	MEDIÇÃO	0%	PAGTO	SALDO
	, and the same of			A second to the first the	0%	-	253.806,79
						-	-
						-	-
						-	-

OBSERVAÇÃO:

Sem análise no mês



### 7 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pavimentação em paralelepípedo na localidade de Serra de João Alves, zona rural do município de Malhada.

CONCEDENTE	i de la la compania de la compania						
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - CODEVASF							
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR			
mana and a company and a company of the company of	002.319-2017		CONTROL LANGUE APPEN OF STORY LEADING STORY (1900) CONTROL CON	250.000,00			

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
		, is the summation of the first summation of the field fine to be a page of the	And a construct to held the transfer of the construction of the co	er personal and an entire property and an entire control control and an entire personal and a second an entire control and an entire	250.000,00

EMPRESA CONTRATADA				an Emilione anni e			
PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA							
PROC. LICITATÓRIO №	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR			
TP 01-2018	2018-056-000	27/04/18	27/06/18	246.105,76			
ADITIVO DE PRAZO	2018-056-001	27/06/18	27/08/18				
ADITIVO DE PRAZO	2018-056-002	27/08/18	27/12/18				
ADITIVO DE PRAZO	2018-056-003	27/12/18	29/04/19				

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

CONT	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	0,00%	VALOR	SALDO
				0,00%	-	246.105,76

#### OBSERVAÇÃO:

Dos trabalhos de análise e acompanhamento da execução deste convênio, esta Controladoria verificou-se que não houve execução de serviços no período em análise





8	OBRA .	SERVIÇOS	<b>DE ENGENHARIA</b>
---	--------	----------	----------------------

Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Malhada.

MINISTÉRIO DAS CIDADE	S			
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
programme and the second secon	850.271-2017	and the second s		250.000,00

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
10 VIII - 10 VII	83 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	The state of the s	The state of the s	The state of the s	250.000,00

EMPRESA CONTRATADA					
LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR	
TP 002-2018	2018-055-000	25/04/18	25/08/18	251.930,32	
ADITIVO DE PRAZO	2018-055-001	25/08/18	21/12/18		
ADITIVO DE PRAZO	2018-055-002	21/12/18	22/04/19		

#### CONTROLE DA EXECUÇÃO

CONT	<b>EMPENHO</b>	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	0,00%	VALOR	SALDO
2019-10				0,00%	-,,	251.930,32
2018-11				0,00%	-	251.930,32
2018-12				0,00%		251.930,32

#### OBSERVAÇÃO:

Dos trabalhos de análise e acompanhamento da execução deste convênio, esta Controladoria verificou-se que não houve execução de serviços no período em análise





#### 9 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pavimentação em paralelepípedos, com drenagem superficial, objetivando atender as ruas Dom Pedro, Santa Madalena, Sem Nome II, Travessa Barão do Rio Branco e Santa Helena no povoado do Julião - Convênio 056/2018 - CONDER

CONCEDENTE						
CODER						
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR		
PAVIMENTAÇÃO	000.056.2018		A Commission of the Commission	-		

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
					-

ME	Company of the second s	e.c	The second secon
ONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
18-118-000	04/06/18	04/10/18	445.988,24
18-118-001	05/10/18	31/01/19	
)	018-118-000 018-118-001	018-118-000 04/06/18	018-118-000 04/06/18 04/10/18

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

2018-09	510-2469	03/09/18	05/09/18	5,11%	22.779,57	423.208,67
2018-10	510-3131	18/10/18	01/11/18	26,04%	116.131,35	307.077,32
2018-12	510-3842	18/12/18	20/12/18	19,05%	84.954,69	222.122,63

#### OBSERVAÇÃO:

Dos trabalhos de análise e acompanhamento da execução deste convênio, esta Controladoria verificou-se que encerrou o exercício de 2018 com metade da obra executada.





### 10 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Canabrava, Contrato de Repasse nº 846.072/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA

CONCEDENTE						
MINISTÉRIO DAS CIDADES						
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR		
PROC. 103.303/2017	846.072-2017	30/12/2017	31/10/2019	386.520,00		

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
06/07/2018	000.000	BCO DO BRASIL	The state of the s	77.304,00	309.216,00

EMPRESA CONTRATADA						
DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR		
TP 004-2018	2018-126-000	08/06/18	08/11/18	270.589,85		
ADITIVO DE PRAZO	2018-126-001	08/11/18	08/04/19			

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

CONT	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	81,84%	VALOR	SALDO
2018-10	508-2906	05/10/18	19/10/18	29,57%	80.000,00	190.589,85
2018-12	508-3844	14/12/18	25/01/19	52,28%	141.454,60	49.135,25

#### OBSERVAÇÃO:

Dos trabalhos de análise e acompanhamento da execução deste convênio, esta Controladoria verificou-se que encerrou o exercício de 2018 com 81,84% da obra executada.



OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Canabrava, Contrato de Repasse nº 862.478/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA

CONCEDENTE						
MINISTÉRIO DAS CIDADES						
PROGRAMA	CONVÉNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR		
PROC. 103.303/2017	862.478-2017	30/12/2017	31/10/2019	386.520,00		

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
					The second secon

LTDA - ME		Paris - Paristandra di 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
2018-127-000	08/06/18	08/11/18	352.971,52
2018-127-001	08/11/18	08/04/19	
	CONTRATO N° 2018-127-000	CONTRATO N° INÍCIO 2018-127-000 08/06/18	CONTRATO №         INÍCIO         TERMINO           2018-127-000         08/06/18         08/11/18

### **CONTROLE DA EXECUÇÃO**

CONT	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	0,00%	VALOR	SALDO
2018-01				0,00%		352.971,52
2018-10				0,00%		352.971,52
2018-12	2018-12			0,00%		352.971,52
				0,00%	-	352.971,52

OBSERVAÇÃO:

Em análise...





#### 12 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Construção de uma ponte de concreto armado nas proximidades do Povoado de Riacho Seco, interligando ao Povoado de Serra de João Alves.

				mit + manual manual succession of section		
RECURSOS PRÓPRIOS						
PROGRAMA	CONVÉNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR		
and the second continued and the second		Control of the contro	*(*)	ar Contract		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO

DISEMBE CONSTRUÇÕE	ES LTDA - ME			
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 005-2018	2018-155-000	07/08/18	07/11/18	91.359,92

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

CONT	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	100,00%	VALOR	SALDO
2018-08	619-2468	31/08/18	27/09/18	49,28%	45.020,98	46.338,94
2018-10	619-2876	05/10/18	15/10/18	50,72%	46.338,84	0,10
	100-110-1111					

OBSERVAÇÃO:

Obra concluída





### 13 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial, objetivando atender as ruas: Barão do Rio Branco, Rua 6, estrada para Canabrava, Rua São José, Rua 03, Rua 04 e Rua Ipiranga, no Distrito do Julião.

CONCEDENTE							
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL							
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR			

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO

EMPRESA CONTRATADA				
EGM PROJETOS E CON	STRUÇÕES LTDA - ME		And the Control of th	a samuaning many a to a to a samuan
PROC. LICITATÓRIO №	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 006-2018	2018-156-000	14/08/18	14/01/19	497.906,65

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	60,52%	VALOR	SALDO
632-2696	24/09/18	26/09/18	34,78%	173.155,66	324.750,99
632-3058	16/10/18	25/10/18	25,75%	128.187,93	196.563,06
-					3,33,33

OBSERVAÇÃO:

Obra concluída





14 OBRA / SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pavimentação em paralelepípedos, objetivando atender as ruas do Povoado de Serra de João Alves, através do convênio nº 2.127.00/2018 - CODEVASF

CODEVASF				
PROGRAMA	CONVÊNIO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
The same of the sa	002.127.000-2018	one case(c) the company of the compa	The state of the s	or been been the sandors are call

#### CONTROLE DO RECEBIMENTO DO REPASSE

DATA	CR Nº	BANCO	CONTA Nº	LIBERAÇÃO	SALDO
					-
				,	

EMPRESA CONTRATADA	MPREENDIMENTOS EIREL	I EDD		
PROC. LICITATÓRIO Nº	CONTRATO Nº	INÍCIO	TERMINO	VALOR
TP 007-2018	2018-185-000	23/10/18	23/02/19	347.116,46

### CONTROLE DA EXECUÇÃO

CONT	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGTO	0,00%	VALOR	SALDO
				0,00%		221.454,60
				0,00%	11,4-4	
				0,00%	-	
				0,00%	-	

OBSERVAÇÃO:

Em análise...





### 07. DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Em atendimento ao disposto no Art. 74 da Constituição Federal, bem como o disposto no Art. 90 da Constituição do Estado da Bahia, a CONTROLADORIA do município de Malhada realiza ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas prevista no PLANO PLURIANUAL e a execução dos PROGRAMA DE GOVERNO do executivo municipal.

Como sistema, todos os órgãos da Administração Publica Municipal estão envolvidos na execução das ações de governo e troca de informações. A controladoria trabalha no fluxo das informações monitorando das atividades com o objetivo de apresentar um mapeamento da execução das metas físicas e financeiras das ações municipais no presente exercício.

Existem inúmeros modelos de avaliação dos serviços e programas governamentais. No entanto, as abordagens que tem merecido maior atenção por parte dos analistas das políticas e programas de governo estão relacionadas ao acompanhamento dos elementos da eficácia, da eficiência e da efetividade.

Sendo assim, para avaliar a eficácia, é necessário medir as metas a produzir e os produtos alcançados de cada um dos projetos e atividades. A avaliação da eficiência requer que se mensurem os produtos e seus custos. A efetividade se obtém mensurando os objetivos e os indicadores de seus impactos sobre a realidade que se quer transformar.

As políticas públicas no exercício em análise está sendo implementados através da execução de 14 (doze) programas, Merecendo destaque para a EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL e SAUDE que absorvem juntas mais de 60% (sessenta por cento) dos recursos orçamentários

A execução dos programas estão previstas através de 127 ( cento e vinte e sete) ações, sendo que 39 (trinta e nove) ações na forma de Projetos e 88 (oitenta e oito) ações na forma de atividades

O monitoramento e a avaliação dos projetos e programas de governo, cria as condições para a melhoria contínua e mensurável da qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos oferecido aos munícipes





O gráfico abaixo apresenta o **percentual de execução** dos programas de governo em relação a valores estimados no instrumento orçamentário

